

ตารางสรุปผลทดสอบ หลุมเจาะที่ : BH-01

BOULTERSTEWART LTD.

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด



เจ้าของงาน : บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริง (2003) จำกัด

โครงการที่ : BSL-17-11233

โครงการ : สะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมโรงพยาบาลจุฬารัตน์-แจ้งวัฒนะซอย5

วันที่เริ่มเจาะ : 25 มิ.ย. 60

สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์-แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่เจาะเสร็จ : 25 มิ.ย. 60

ตำแหน่งเจาะ N : 1,535,083 E : 670,421 ระดับผิวดิน : - เมตร. วันที่ทดสอบ LAB. : 28-30/6/2017

ค่าระดับน้ำ ณ.วันที่เจาะ : 2.70 เมตร. ความลึกหลุมเจาะ : 40.95 เมตร. เจาะสำรวจโดย : วิชุด

รหัสเก็บ & ตัวอย่างที่	ความลึก (ม.)		RECOVER ชนิดดิน [USCS]	จำแนกประเภทดิน	ขนาดผล (%) ร่อนผ่านตะแกรง				ความชื้น ธรรมชาติ (%)	ATTERBERG LIMITS AND INDICIES				ความหนาแน่นรวม (ตัน/ม ³)	Su (t/sq.m)		SPT-N [จำนวน ครั้ง/ฟุต]
	จาก	ถึง			#4	#10	#40	#200		LL (%)	PL (%)	PI (%)	LI		PP	UC Qu/2	
PA	0.00	1.50															
ST -1	1.00	2.00	50	CL	100	100	100	98	26	33	21	12	0.38	1.66		16.84	
ST -2	3.00	3.50	50	CL	96	95	95	92	25	31	19	12	0.49	1.63		5.29	
ST -3	4.50	5.00	50	CL	100	100	100	99	59	32	20	12	3.24	1.79		2.90	
ST -4	6.00	6.50	50	CL	100	99	98	97	66	48	21	27	1.66	1.67		1.75	
ST -5	7.50	8.00	50	CL	100	100	100	98	69	45	20	25	1.95	1.66		2.11	
ST -6	9.00	9.50	50	CL	100	100	99	94	56	48	27	21	1.37	1.67		2.55	
ST -7	10.50	11.00	NR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ST -8	12.00	12.50	50	CL	100	100	100	98	53	43	22	21	1.49	1.71		4.21	
ST -9	13.50	14.00	50	CL	100	100	97	92	30	39	21	18	0.50	1.61		2.25	
SS -1	15.00	15.45	23	CL	100	100	100	84	27	43	22	21	0.22	1.86			22
SS -2	16.50	16.95	20	CL	100	100	100	89	23	37	19	18	0.21	1.91			27
SS -3	18.00	18.45	25	CL	100	100	100	71	19	31	19	12	0.04	1.96			35
SS -4	19.50	19.95	18	SM	99	99	97	38	20	NON-PLASTIC		-	-	1.94			41
SS -5	21.00	21.30	13	SM	100	100	98	19	21	NON-PLASTIC		-	-	1.83			69
SS -6	22.50	22.95	15	SM	100	100	99	16	21	NON-PLASTIC		-	-	1.89			59
SS -7	24.00	24.45	20	SM	96	94	93	20	23	NON-PLASTIC		-	-	1.92			68
SS -8	25.50	25.95	NR	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			50
SS -9	27.00	27.15	10	SM	99	88	39	26	8	NON-PLASTIC		-	-	1.84			54
SS -10	28.50	28.80	NR	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			77
SS -11	30.00	30.30	18	CL	100	100	100	98	18	45	20	25	-0.06	1.92			61
SS -12	31.50	31.95	29	CL	100	99	96	87	8	37	21	16	-0.79	1.85			63
SS -13	33.00	33.30	18	CL	100	100	100	98	20	45	23	22	-0.12	1.87			58
SS -14	34.50	34.95	21	CL	100	100	98	96	20	45	-6	51	0.52	1.96			58

USCS = UNIFIED SOIL CLASSIFICATION SYSTEM

PI = PLASTICITY INDEX

Su = UNCONFINED SHEAR STRENGTH

LL = LIQUID LIMIT

LI = LIQUIDITY INDEX

UC = UNCONFINED COMPRESSION TEST

PL = PLASTIC LIMIT

SPT = STANDARD PENETRATION TEST

PP = POCKET PENETRATION TEST

PP = POCKET PENETRATION TEST

กราฟแสดงรูปตัดชั้นดิน : หลุมเจาะที่ BH-01

BOULTERSTEWART LTD.



บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด

เจ้าของงาน : บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริง (2003) จำกัด

โครงการที่ : BSL-17-11233

โครงการ : สะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมโรงพยาบาลจุฬารัตน-แจ้งวัฒนะซอย5


วันที่เริ่มเจาะ : 25 มิ.ย. 60

สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน-แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่เจาะเสร็จ : 25 มิ.ย. 60

ตำแหน่ง N : 1,535,083 E : 670,421 ค่ายระดับผิวดิน : - เมตร วันที่ทดสอบ LAB. : 28-30/6/2017

ค่ายระดับน้ำ ณ.วันที่เจาะ : 2.70 เมตร ความลึกหลุมเจาะ : 40.95 เมตร เจาะสำรวจโดย : รัชิต

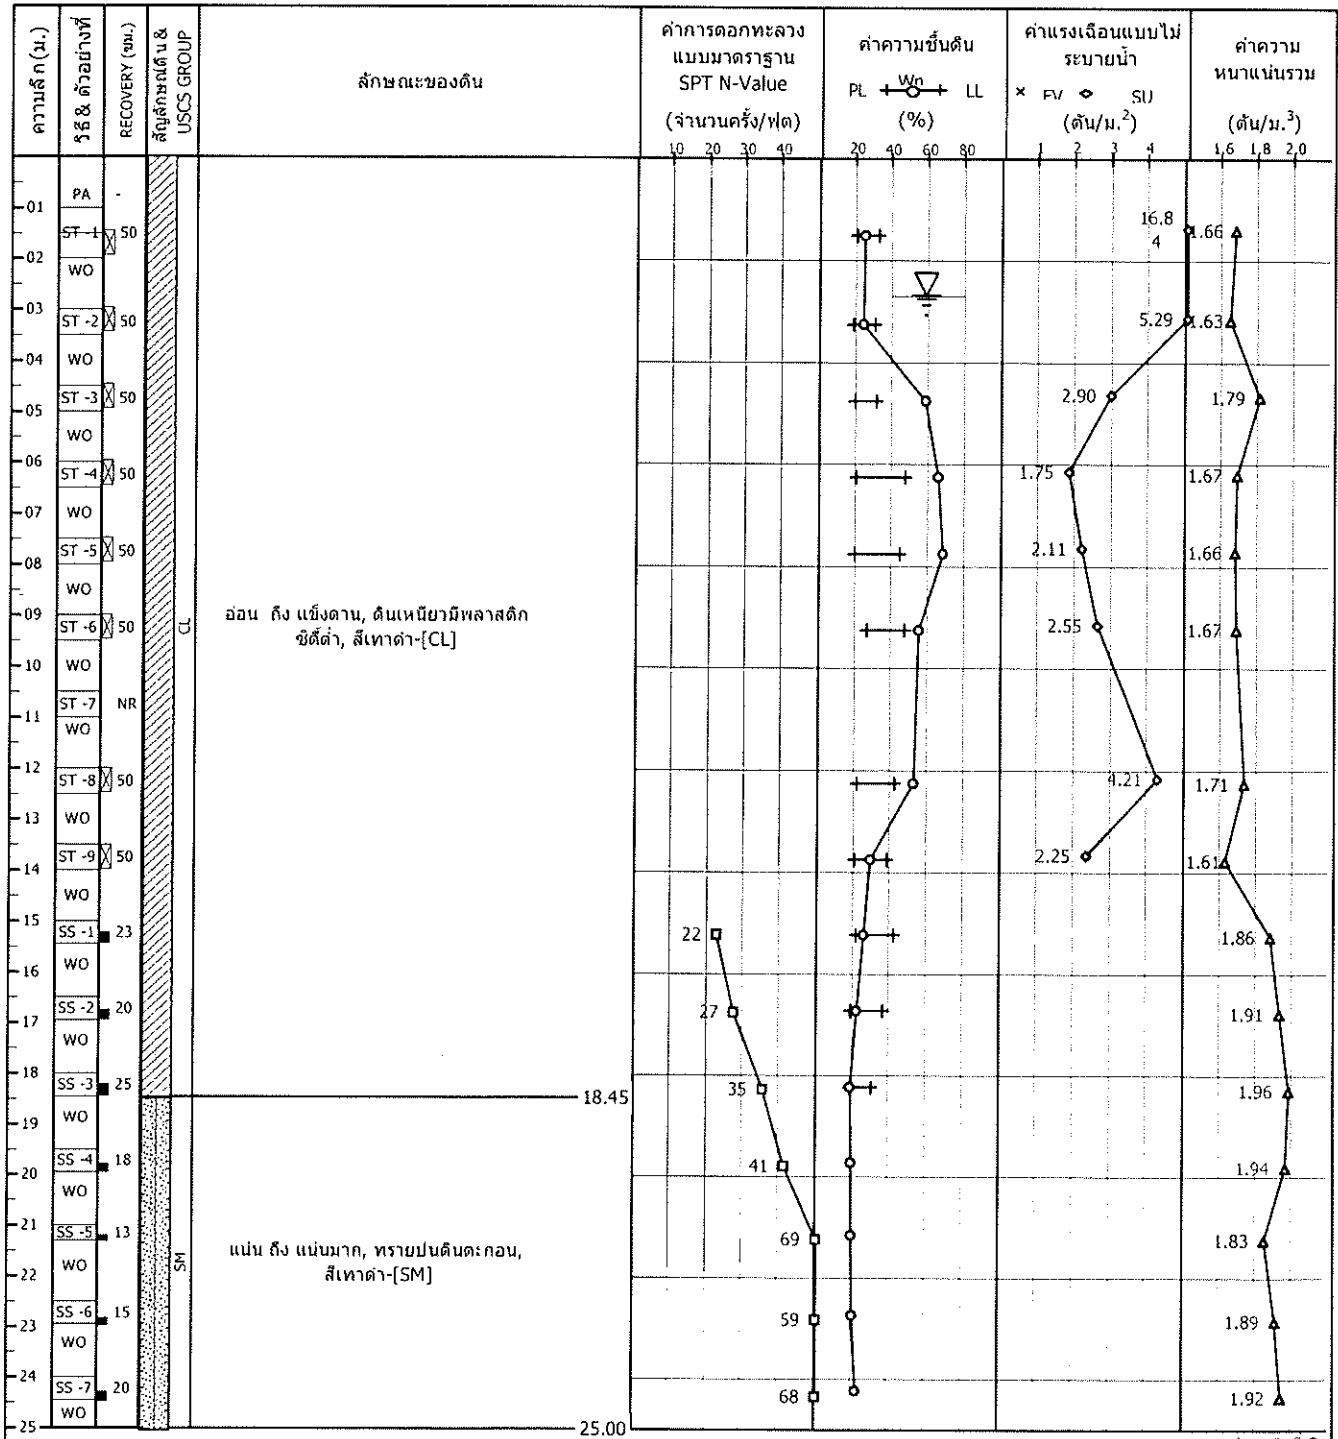

กราฟแสดงรูปตัดชั้นดิน : หลุมเจาะที่ BH-01

BOULTERSTEWART LTD.

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด



เจ้าของงาน : บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริง (2003) จำกัด

โครงการที่ : BSL-17-11233

โครงการ : สะพานข้ามคลองเปรมประชากรเชื่อมโรงพยาบาลจุฬารัตน-แจ้งวัฒนะซอย5

วันที่เริ่มเจาะ : 25 มี.ย. 60

สถานที่ : โรงพยาบาลจุฬารัตน์-แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่เจาะเสร็จ : 25 มิ.ย. 60

ตำแหน่ง N : 1,535,083 E : 670,421 ค่าระดับผิวดิน : - เมตร วันที่ทดสอบ LAB. : 28-30/6/2017

ค่าระดับน้ำ ณ.วันที่เจาะ : 2.70 เมตร. ความลึกก้นหลุมเจาะ : 40.95 เมตร. เจาะสำรวจโดย : รัชิต

