

รายงาน การเจาะสำรวจชั้นดิน

โครงการ ก่อสร้างแก้มลิงบึงหนองปลาหมอ

แขวงคลองสีบ เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร



บริษัท เกษมดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

180/61-62, 95 อาคารสุขสวัสดิ์โมเดิร์นคอนโดวิว ถนนสุขสวัสดิ์

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร: (02) 818 – 0881 แฟกซ์ : (02) 408 – 3924

อีเมล : kacon@kasemdesign.com เว็บไซต์ : www.kasemdesign.com



รายงานการเจาะสำรวจชั้นดิน

โครงการ ก่อสร้างแก้มลิง หนองปลาหมอ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย

นายวรพจน์ เพชรเกตุ วย.1884

4.1. ตารางตำแหน่งหลุมเจาะ

หลุมเจาะที่		COORDINATE	
		N	E
BH –	1	1536805.57	698992.03

4.2. ตารางลักษณะชั้นดิน

หลุมเจาะที่	ชั้นที่	ความลึก (เมตร)		ลักษณะชั้นดิน
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	
BH – 1	1	0.00	16.50	ชั้นดินเหนียวอ่อน สีเทา
	2	16.50	18.00	ชั้นดินเหนียวแข็งมาก สีน้ำตาล
	3	18.00	30.45	ชั้นทรายละเอียด สีน้ำตาล

5. สภาพระดับน้ำ

โดยปกติระดับน้ำใต้ดินในหลุมเจาะ จะวัดหลังจากการเจาะสำรวจแล้วเสร็จประมาณ 24 ชั่วโมง ในการเจาะสำรวจครั้งนี้ พบว่า ค่าระดับน้ำใต้ดินช่วงวันเจาะสำรวจ อยู่ที่ระดับความลึกจากผิวดินโดยประมาณดังนี้:-

หลุมเจาะที่	ระดับน้ำใต้ดิน (เมตร)
BH – 1	- 2.00

9. สรุปข้อเสนอแนะ (Recommendation)

ฐานรากเสาเข็ม

ในการออกแบบฐานราก โครงการ *ก่อสร้างแก้มลิงบึงหนองปลาหมอ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร* นั้น ต้องออกแบบให้ฐานรากวางบนเสาเข็ม เสาเข็มที่ใช้เป็นเสาเข็มตอกที่มีพื้นที่หน้าตัดโตผลิตได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 396 - 49 ถ้าจำเป็นต้องใช้เสาเข็มสองท่อนต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า หัวตอต้องแข็งแรง สามารถรับโมเมนต์คัต แรงอัด และแรงถอนได้ไม่น้อยกว่าตัวเสาเข็ม คอนกรีตที่ผลิตเสาเข็มต้องใช้ค่า $f_c' \geq 350$ ksc. ถ้าเป็นเสาเข็มเจาะคอนกรีตที่ใช้ผลิตเสาเข็มต้องใช้ค่า $f_c' \geq 210$ ksc. ค่า f_c' ที่กล่าวถึงนี้ ได้จากการทดสอบแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน ตุ่มที่ใช้ตอกต้องหนักไม่น้อยกว่าตัวเสาเข็มทุกท่อน การใช้ตัวทอนความปลอดภัย ใช้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (2527) ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ 2.5 สำหรับดิน ส่วนตัวทอนความปลอดภัยของคอนกรีตนั้น ใช้ตัวทอนความปลอดภัยเท่ากับ 4 ตาม New York Code และ Chicago Code ขนาดเสาเข็มที่แนะนำ และน้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยที่แนะนำได้กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้

ชนิดเสาเข็ม	ขนาด, เมตร	Pile top อยู่ที่ระดับ, เมตร	Pile tip อยู่ที่ระดับ, เมตร	การรับน้ำหนักบรรทุก ปลอดภัย ในฐานเสาเข็มเดี่ยว FS = 2.5 ; ตัน
เสาเข็มเจาะ (ระบบแห้ง)	Ø 0.35 m. ยาว 17.00 เมตร	± 0.00	- 17.00	19
เสาเข็มเจาะ (ระบบแห้ง)	Ø 0.50 m. ยาว 17.00 เมตร	± 0.00	- 17.00	30
เสาเข็มเจาะ (ระบบแห้ง)	Ø 0.60 m. ยาว 17.00 เมตร	± 0.00	- 17.00	38
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	I 0.26 × 0.26 m. ยาว 22.50 เมตร	± 0.00	- 22.50	30
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	I 0.30 × 0.30 m. ยาว 22.50 เมตร	± 0.00	- 22.50	40
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	I 0.35 × 0.35 m. ยาว 22.50 เมตร	± 0.00	- 22.50	55

ชนิดเสาเข็ม	ขนาด, เมตร	Pile top อยู่ที่ระดับ, เมตร	Pile tip อยู่ที่ระดับ, เมตร	การรับน้ำหนักบรรทุก ปลอดภัย ในฐานเสาเข็มเดี่ยว FS = 2.5 ; ตัน
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	□ 0.26 × 0.26 m. ยาว 22.50 เมตร	± 0.00	- 22.50	40
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	□ 0.30 × 0.30 m. ยาว 22.50 เมตร	± 0.00	- 22.50	50
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	□ 0.35 × 0.35 m. ยาว 22.50 เมตร	± 0.00	- 22.50	60


หมายเหตุ**เสาเข็มตอก**

- ให้ลองสุ่มตอกดินแปลง กลางแปลง และท้ายแปลง อย่างละ 1 ตัน ในแต่ละโซน เพื่อดูความแปรปรวนของดินและความสามารถในการตอกได้ ให้นับ Blow Count ประกอบการตอกด้วย
- ควรสุ่มทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเสาเข็มที่ใช้ในโครงการ
- เสาเข็มตอก ถ้าจำเป็นต้องใช้เสาเข็มแบบต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้า หัวต่อต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าตัวเสาเข็ม ความหนาของเหล็กหัวต่อ (End Plate) และแถบเหล็ก (Steel Band) เป็นไปตาม มอก. 396 - 49 สำหรับเสาเข็มรูป □ หรือรูปตัว I และตาม มอก. 398 - 2537 สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงขณะติดตั้งหรือตอกเสาเข็ม ความคลาดเคลื่อนของเหล็กหัวต่อในแนวตั้งต้องไม่เกิน 2 มิลลิเมตร หัวต่อต้องแนบกันสนิทก่อนเชื่อมด้วยไฟฟ้า เมื่อตรวจสอบแนวตั้งแล้ว เหล็กหัวต่อต้องมีช่องว่าง ต้องห่างกันได้ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร ที่ด้านใดด้านหนึ่ง การเชื่อมเหล็กหัวต่อ ให้เชื่อมด้วยไฟฟ้า รอยเชื่อมต้องแข็งแรง ต้องรับโมเมนต์ดัดได้ไม่น้อยกว่าตัวเสาเข็ม เสาเข็มที่ใช้ ต้องได้มาตรฐาน มอก. นั้นๆ
- ตุ่มที่ใช้ตอกต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเสาเข็มทั้งต้น

เสาเข็มเจาะระบบแห้ง

- ท่อค้ำกัน (Casing) ควรยาวไม่น้อยกว่าความลึกของชั้นดินเหนียวอ่อน + 0.50 เมตร
- คอนกรีตที่ใช้เทควรมีค่า Strength ≥ 210 ksc. ทรงกระบอก และค่า Slump ≥ 15 ซม.
- ปริมาณเหล็กเสริมตามยาวในเสาเข็ม ใส่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของพื้นที่หน้าตัด แต่จำนวนเส้นต้องไม่น้อยกว่า 6 เส้น เสริมยาวตลอดต้น
- ตอนเทคอนกรีตต้องตรวจสอบปริมาณคอนกรีตที่เทเทียบกับปริมาตรหลุมเจาะ
- ควรสุ่มทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเสาเข็มที่ใช้ในโครงการ

1.1



KASEMDESIGN AND CONSULTANT CO., LTD.

180/61 – 62, 95 Suksawat Modern Condoview, 7th Floor, Suksawat Rd., Ratburana, Bangkok 10140


Tel. (02) 818 - 0881 - 2 Fax. (02) 818 - 1369 Website: www.kasemdesign.com E-mail: kacon@kasemdesign.com

SUMMARY OF TEST RESULT

Project : ก่อสร้างแก้มลิงป้องกันน้ำท่วม


Location : เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

Boring : BH- 1				PHYSICAL PROPERTIES				ATTERBERG LIMITS			Soil Class.	ENGINEERING PROPERTIES				
Sample No.	DEPTH, m.		W _n %	γ g/cc	% passing		LL %	PL %	PI %	S _u ton/m ²		S _{ur} ton/m ²	Q _p ton/m ²	N blows/ft.	V _s ton/m ²	
	FROM	TO			#4	#200										
ST 1	1.50	2.00	79.39	1.46			82.42	28.22	54.20	CH	3.32					
ST 2	3.00	3.50	74.28	1.51			85.19	31.48	53.71	CH	5.80					
ST 3	4.50	5.00	73.22	1.56							1.45					
ST 4	6.00	6.50	95.22	1.45			81.21	31.44	49.77	CH	1.06					
ST 5	7.50	8.00	61.95	1.64							1.33					
ST 6	9.00	9.50	75.26	1.54			71.26	29.56	41.70	CH	0.56					
ST 7	10.50	11.00														
ST 8	12.00	12.50	70.58	1.58			66.28	37.66	28.62	CH	1.32					
ST 9	13.50	14.00	62.99	1.59			72.46	29.09	43.37	CH	2.69					
ST 10	15.00	15.45	28.04	1.64			50.37	16.66	33.71	CH	1.80					
SS 11	16.50	16.95	22.40	1.96			36.19	18.22	17.97	CL	16.69			25		
SS 12	18.00	18.45	25.68		100.00	48.16				SM				24		
SS 13	19.50	19.95	19.54		96.14	18.99				SM				20		
SS 14	21.00	21.45	21.28		100.00	24.99				SM				24		
SS 15	22.50	22.95	20.34		100.00	19.08				SM				48		
SS 16	24.00	24.45	21.89		100.00	16.12				SM				51		
SS 17	25.50	25.95	22.89		100.00	15.59				SM				32		
SS 18	27.00	27.45												27		
SS 19	28.50	28.95	20.05		100.00	19.54				SM				38		
SS 20	30.00	30.45	22.43		100.00	15.43				SM				45		
PHYSICAL PROPERTIES					ATTERBERG LIMITS					ENGINEERING PROPERTIES						
W _n = Natural Water Content					LL = Liquid Limit					S _u = Undrained Shear Strength						
g = Bulk Unit Weight					PL = Plastic Limit					S _{ur} = Remolded Shear Strength						
G = Specific Gravity					PI = Plasticity Index					V _s = Vane Shear Strength						
					SL = Shrinkage Limit					N = Standard Penetration Number						



KASEM DESIGN AND CONSULTANT CO., LTD.

ก.2 กราฟแสดงชั้นดิน (Boring Log)

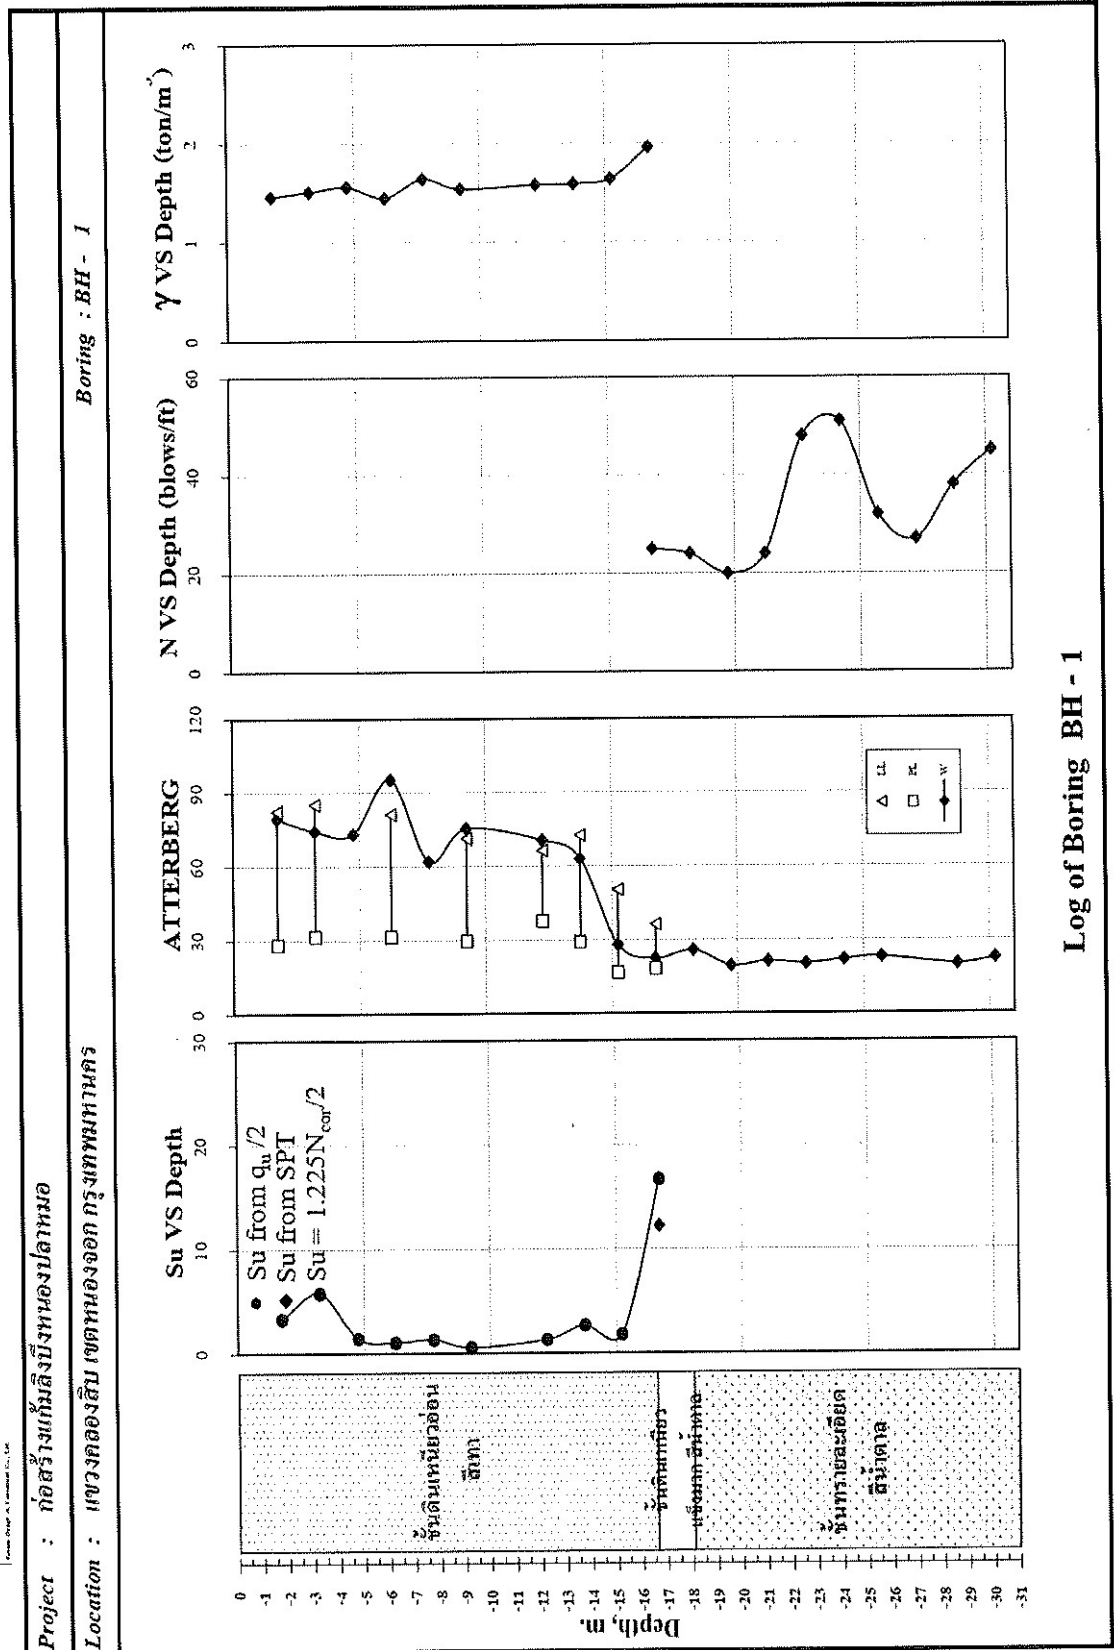

Log of Boring BH - 1



ก.5 Consolidation Test




GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING KMUTT
CONSOLIDATION TEST (ASTM D2434)

For : บริษัท เกษมดีชาชนันท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
Project Name : งานก่อสร้างแก้มลิงบึงหนองปลาหมอ
Sample : BH-1 ตัวอย่างที่ ST-05 ที่ความลึก 07.50-08.00
Date of Test : 25/07/2022 ถึง 02/08/2022

Compression Index, c_c	1.2249	Density (g/cm^3)	1.385
Recompression Index, c_r	0.1193	Specific gravity, G_s	2.65
Swelling Index, c_s	0.0432	Water Content (%)	213.46
Maximum past pressure, σ'_{pc} (kPa)	45.47	Initial Voids Ratio, e_0	3.856

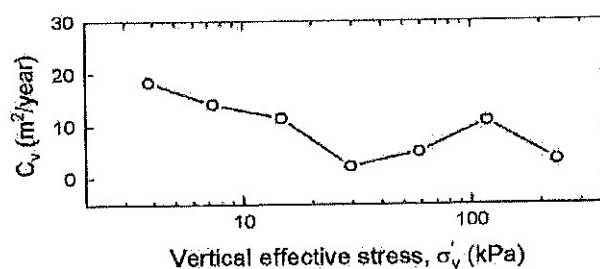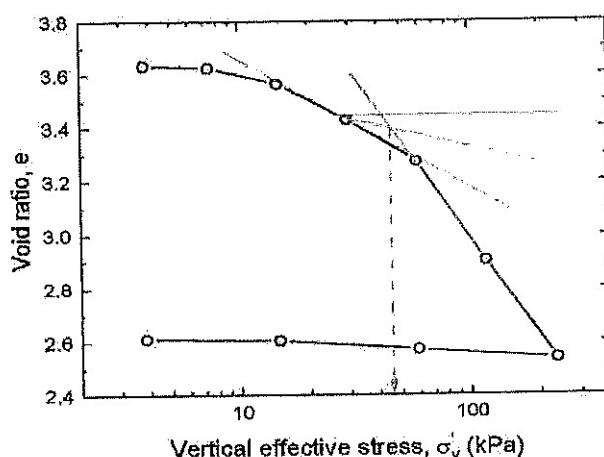

Tested By: 
(Asst. Prof. Dr.Sompote Youwai)

Checked By: 
(Dr.Julapote Chiravachradej)
Head of Civil Engineering Department

Remarks: 1. Test results are good only for those specimens tested.
2. Not valid unless be signed and sealed

ก.5 Consolidation Test



GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING KMUTT
CONSOLIDATION TEST (ASTM D2434)



For : บริษัท เกษมดีชัยน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Project Name : งานก่อสร้างแก้มลิงป้องกันน้ำท่วม

Sample : BH-1 ตัวอย่างที่ ST-07 ที่ความลึก 10.50-11.00

Date of Test : 02-10/08/2022

Compression Index, c_c	0.2090	Density (g/cm^3)	1.679
Recompression Index, c_r	0.0628	Specific gravity, G_s	2.65
Swelling Index, c_s	0.0069	Water Content (%)	47.74
Maximum past pressure, σ'_{po} (kPa)	29.49	Initial Voids Ratio, e_0	1.5754

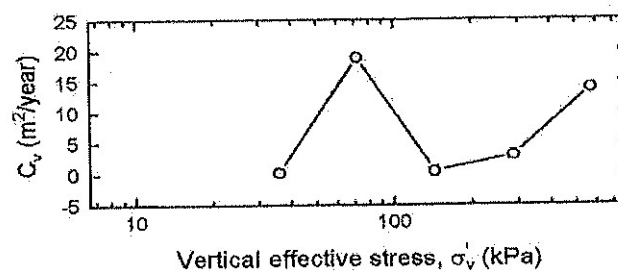
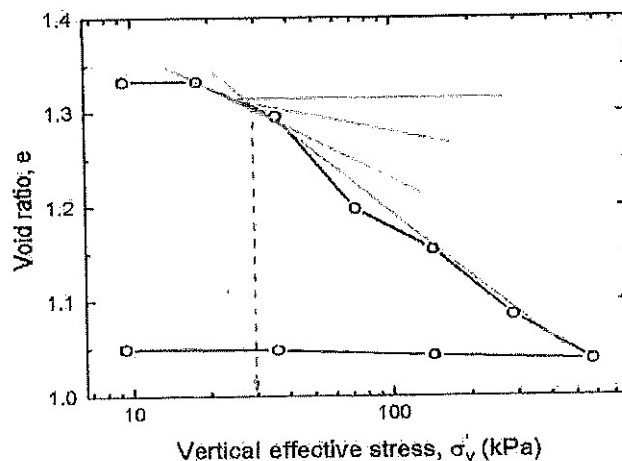


Tested By:
(Asst. Prof. Dr.Sompote Youwai)

Checked By:
(Dr.Julapot Chirivachradej)
Head of Civil Engineering Department

Remarks: 1. Test results are good only for those specimens tested.
2. Not valid unless be signed and sealed

ข.1 : แผนผัง ตำแหน่งแสดงหลุมเจาะ (Lay - out Plan)

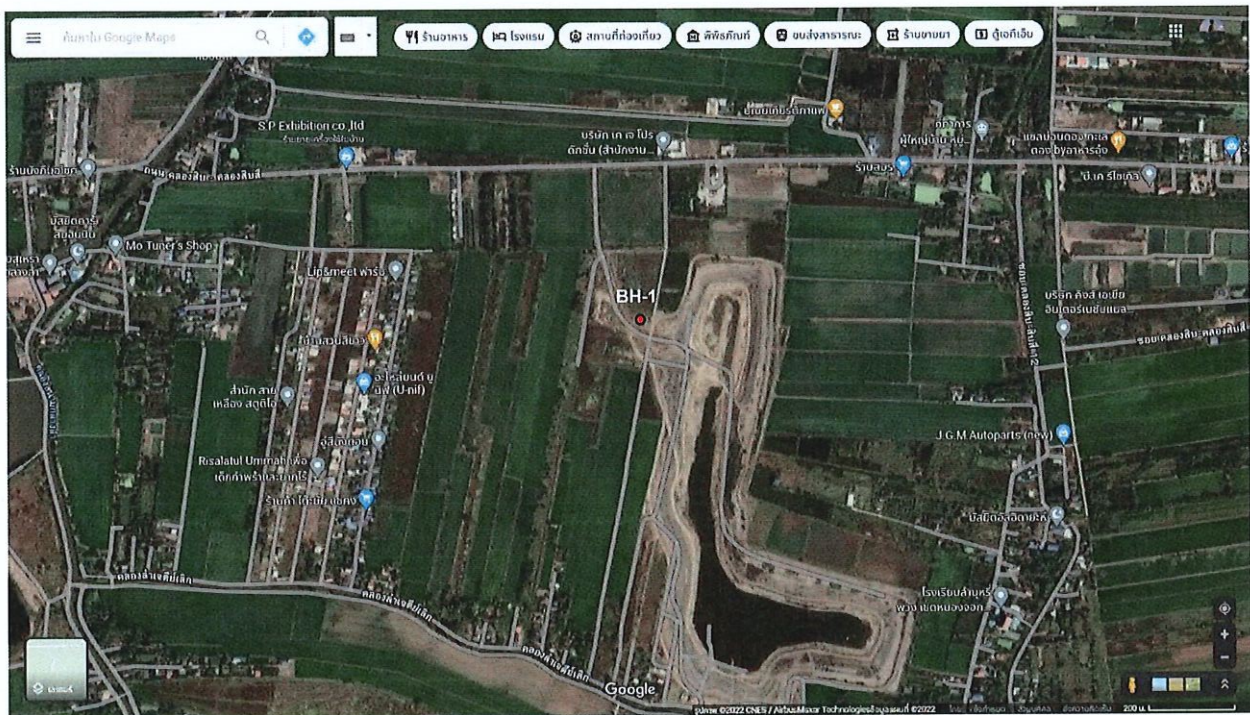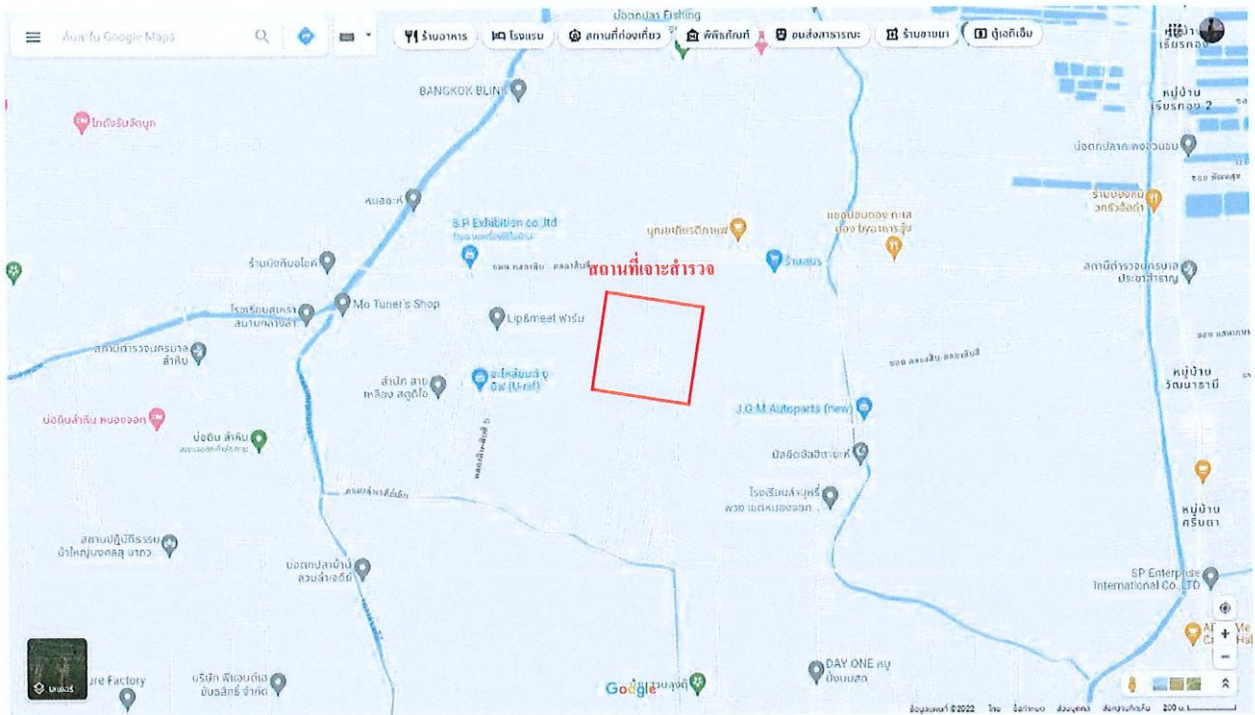

หลุมเจาะที่		COORDINATE	
		N	E
BH -	1	1536805.57	698992.03
